

Strateginis Vilniaus miesto savivaldybės projektas:

**REGULIARAUS VIEŠOJO TRANSPORTO MARŠRUTO ORGANIZAVIMAS
NERIES UPE VILNIAUS MIESTE**

Laivybos skyriaus vadovas: Mindaugas Žiedelis




VILNIUS

Dalis Neries upės įveiklinimo programos



VANDENS TRANSPORTO KURIAMA VERTĖ MIESTUI

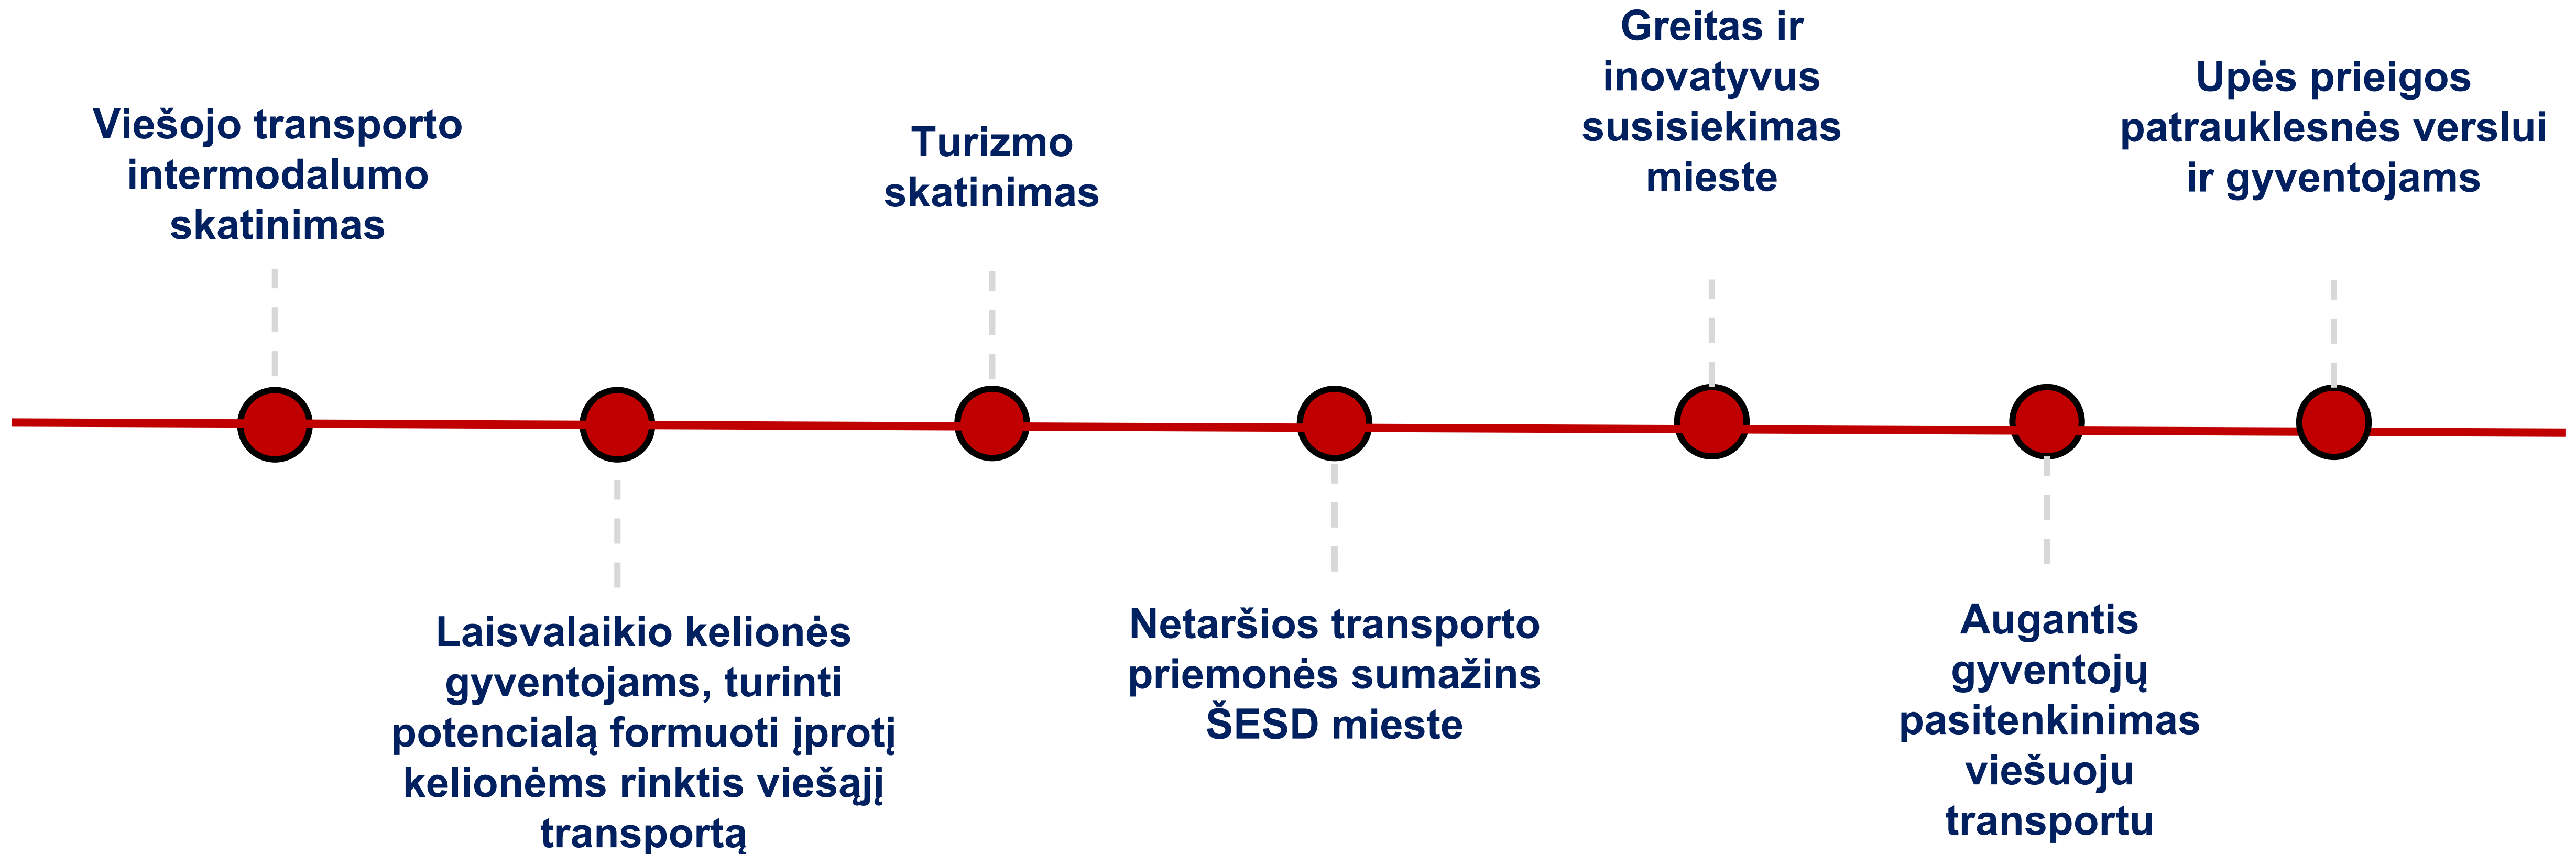

LAIVYBOS, KAIP VIEŠOJO TRANSPORTO DALIES, PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS



- **Vilniaus miesto savivaldybė:** užsakovas
- **JUDU:** paslaugos organizatorius (stočių numatymas, tvarkaraščiai, kokybiniai reikalavimai)
- **Vilniaus viešasis transportas:** projekto valdymas, transporto pirkėjas-savininkas, operatorius
- **Grinda:** infrastruktūros rangovas (krantinių įrengimas, stotelių įrengimas, upės gilinimo darbai), priežiūra
- **Vilniaus apšvietimas:** elektros darbai, prieigų sutvarkymas

Planuojama veiklos pradžia: 2025 m. birželis-liepa


Sezonas: gegužė – spalį (atsižvelgiant į vidaus vandenų laivybos navigacijos sezoną)

Projekto esminiai etapai




Prieplaukos ir prieigos

- Prieplaukų gamyba ir įrengimas
- Prieigų infrastruktūriniai darbai
- Viešojo transporto prieplaukų naudojimosi tvarkos tvirtinimas



El. pakrovimo stotys

- Laivų el. įkrovimo stotelių įrengimo darbai



Transporto priemonės

- Laivų statyba
- Laivų išorės ir vidaus dizaino derinimas ir įrengimo darbai
- Keleivių informavimo sistemų pirkimas ir įrengimas




Laivakelis

- Seklumų šalinimo darbai
- Farvaterio ženklinimo darbai




Įgula

- 15 kapitonų įdarbinimas
- 20 upeivių įdarbinimas ir mokymai



Paslaugos organizavimas

- Pasirengimas paslaugos startui: procesai,
- Komunikacija ir keleivių informavimas
- Bandomieji plaukimai
- Keleivių kontrolė ir bendrųjų taisyklių papildymas

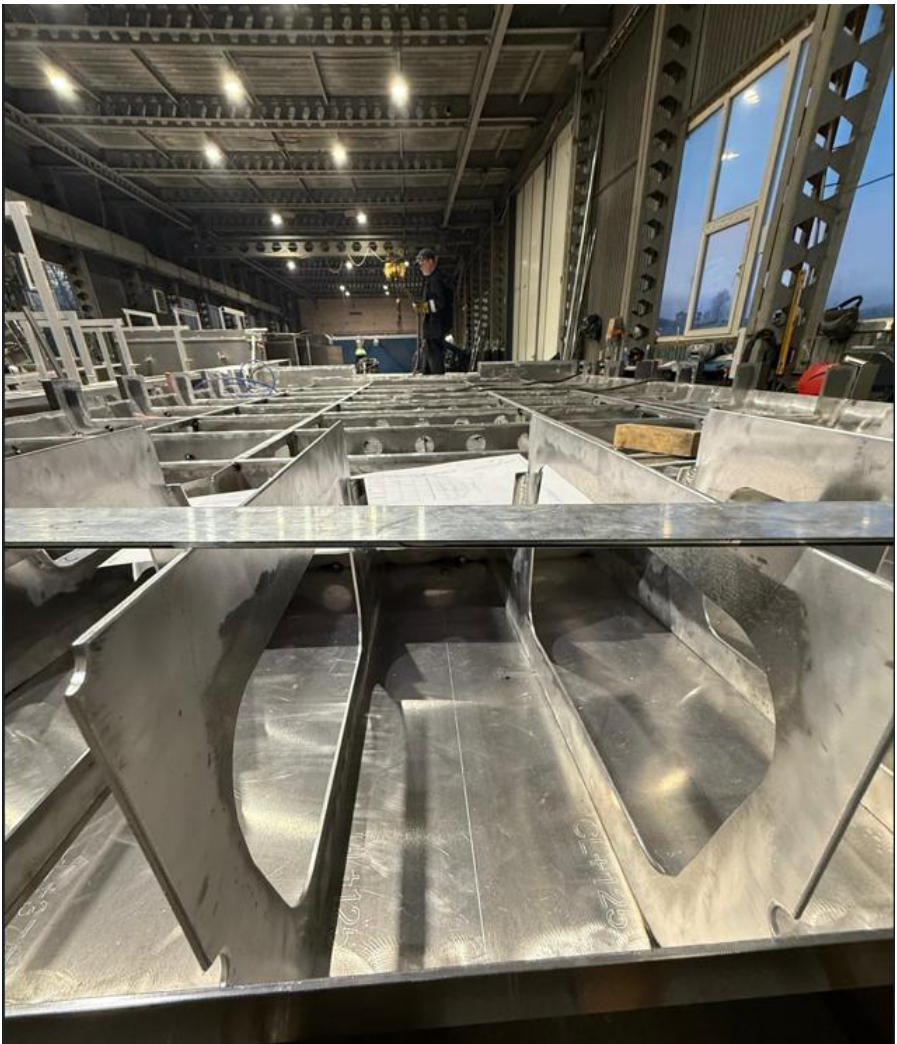

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKIMUI

- **Paslaugų teikimo terminas** – 10 metų nuo paslaugų teikimo pradžios.
- **Metinės ridos apimtys** – bendra preliminarinė metinė rida ~90 000 km, su galimybe -30% ir +50%.
- **Kursavimo dažnumas** – kas ≤ 30 min.
- **Transporto priemonių skaičius** – 2025 m. iki 4 laivų, iki 2023 m. iki 8 laivų (atsižvelgiant į maršruto trasas ir dažnumo užtikrinimą).
- **Transporto priemonės tipas** – elektriniai laivai (30-40 vietų) pritaikyti individualių poreikių turintiems asmenims, dviračiams.

LAIVYBOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA



100

Task name	Start date	End date	2025											
			Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
	2024-12-11	2025-12-31	Today											
+ Prieigos	2025-01-01	2025-07-11	- 2025-07-11											
+ Prieplaukos	2024-12-30	2025-07-18	30 - 2025-07-18											
+ Transporto priemonės - laivai	2024-12-24	2025-07-18	laivai 2024-12-24 - 2025-07-18											
- Vandens kelias	2025-03-31	2025-07-14	Vandens kelias 2025-03-31 - 2025-07-14											
Kelio ženklinimas (bujai)	2025-06-02	2025-06-06	MZ											
+ PAV atranka	2025-03-31	2025-06-13	PAV atranka 2025-03-31 - 2025-06-13											
+ Seklumų valymas	2025-07-01	2025-07-14	Seklumų valymas 2025-07-01 - 2025-07-14											
+ 5. Laivų krovimo stotelės	2025-01-06	2025-04-30	otelės 2025-01-06 - 2025-04-30											
+ 6. Paslaugos organizavimas	2025-01-13	2025-08-01	anizavimas 2025-01-13 - 2025-08-01											
+ Trišalė sutartis	2025-01-14	2025-05-15	2025-01-14 - 2025-05-15											
+ Personalo rengimas	2025-01-14	2025-04-15	nas 2025-01-14 - 2025-04-15											
+ E. Bilietas ir įranga	2024-12-11	2025-06-10	11 - 2025-06-10											
+ Informacija keleiviams, komunikacija	2025-03-03	2025-05-30	Informacija keleiviams, komunikacija 2025-03-03 - 2025-05-30											
+ Komunikacija	2025-04-11	2025-07-16	Komunikacija 2025-04-11 - 2025-07-16											
+ Specialusis planas	2024-12-19	2025-12-31	12-19 - 2025-12-31											

PASLAUGOS ORGANIZAVIMAS 2025 M.

Nuo **liepos** mėnesio:

- 2 laivai
- Verslo trikampis – Mindaugo tiltas
- ~3 km atkarpa
- Kursuoja kas ~25 min
- El. krovimas vykdomas Verslo trikampio prieplaukoje

Nuo **rugpjūčio** mėnesio:

- 4 laivai
- Verslo trikampis – Žirmūnų paplūdimys (papildomai iki Valakampių II paplūdimio)
- 10,5km atkarpa
- Kursuoja kas ~35 min
- El. krovimas vykdomas Verslo trikampio ir Žirmūnų paplūdimio prieplaukose


2025 – 2030 metai

- 8 laivai
- Valakampiai - Vingio parkas (+4 stot.)

2025m. sezono Upės VT paslauga

Sutartiniai ženklai:


- stotelė – liepos mėn.
- Stotelė – rugpjūčio mėn.
- Maršrutas

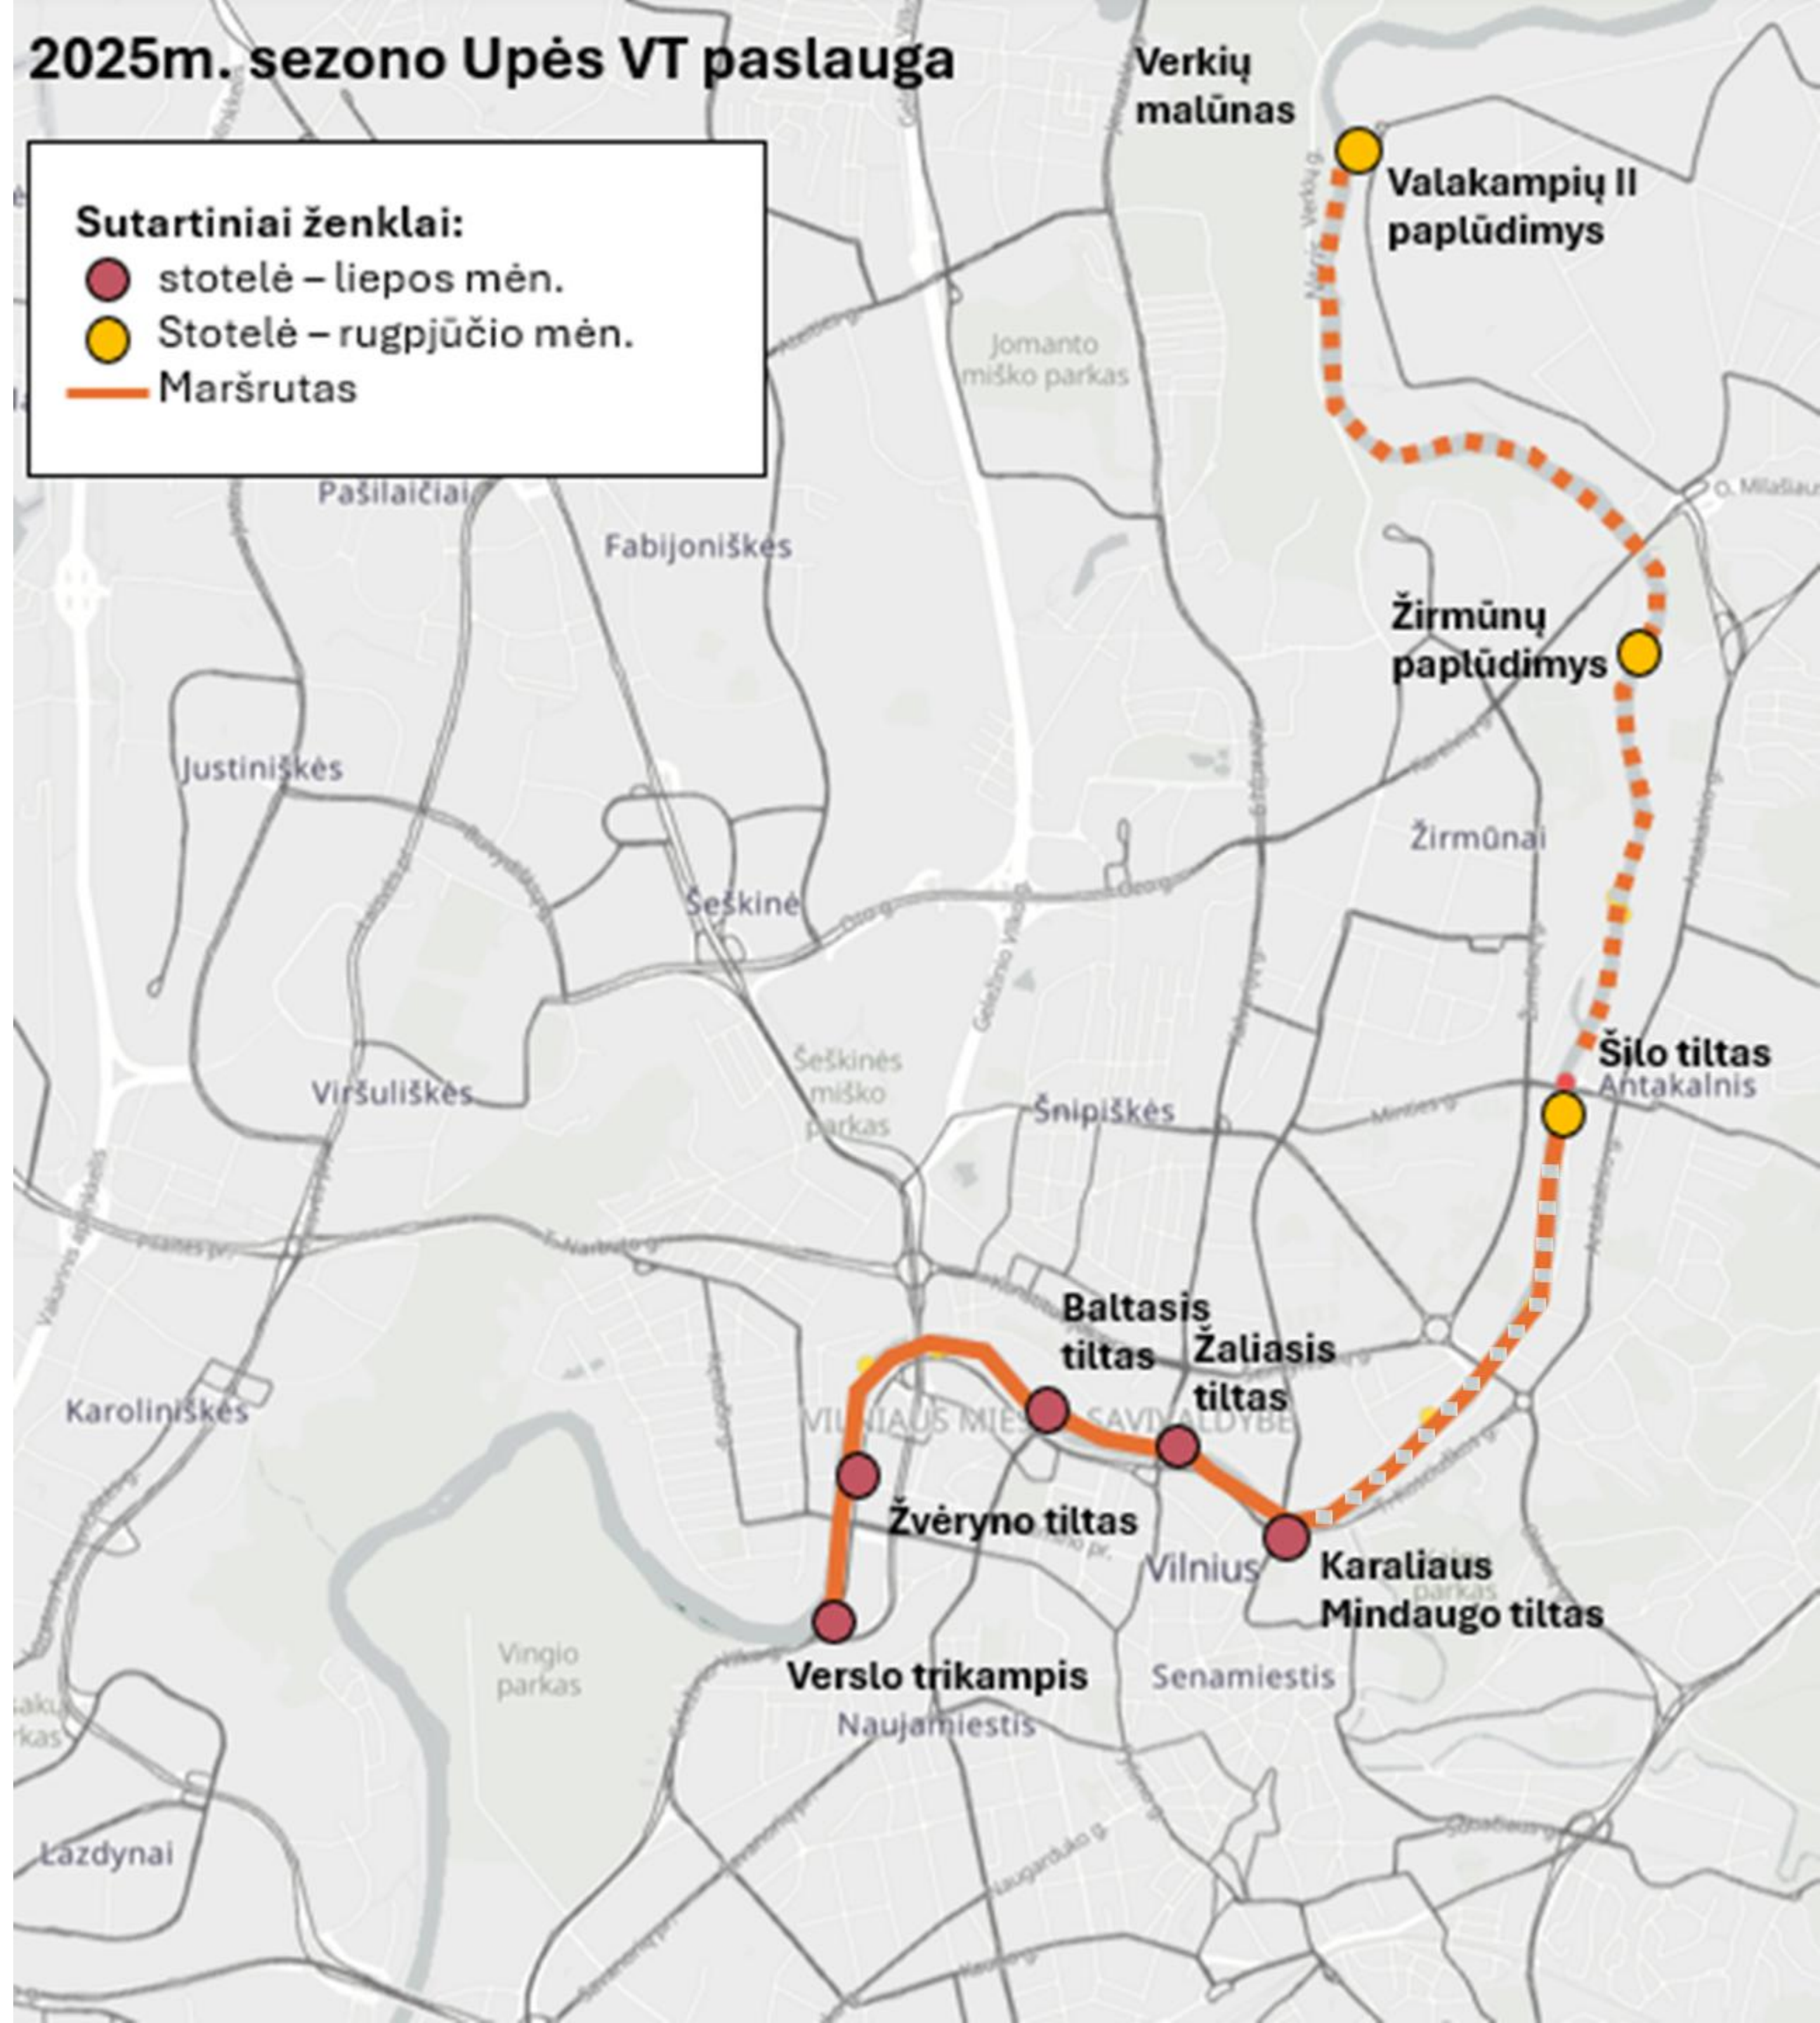


Laivų pagrindiniai parametrai



- Tipas: katamaranas
- Korpusas: aliumininis
- Elektra varomi: 2 varikliai 110kW, baterijos – 280kWh
- Išmatavimai: 4.6m x 13m
- Svoris: iki 12 tonų
- Grimzlė: 70cm su keleiviais
- Greitis: iki 20 km/h (vidutiniškai 15km/h)
- 32 vietos + dviračių ir neįgaliųjų vietos

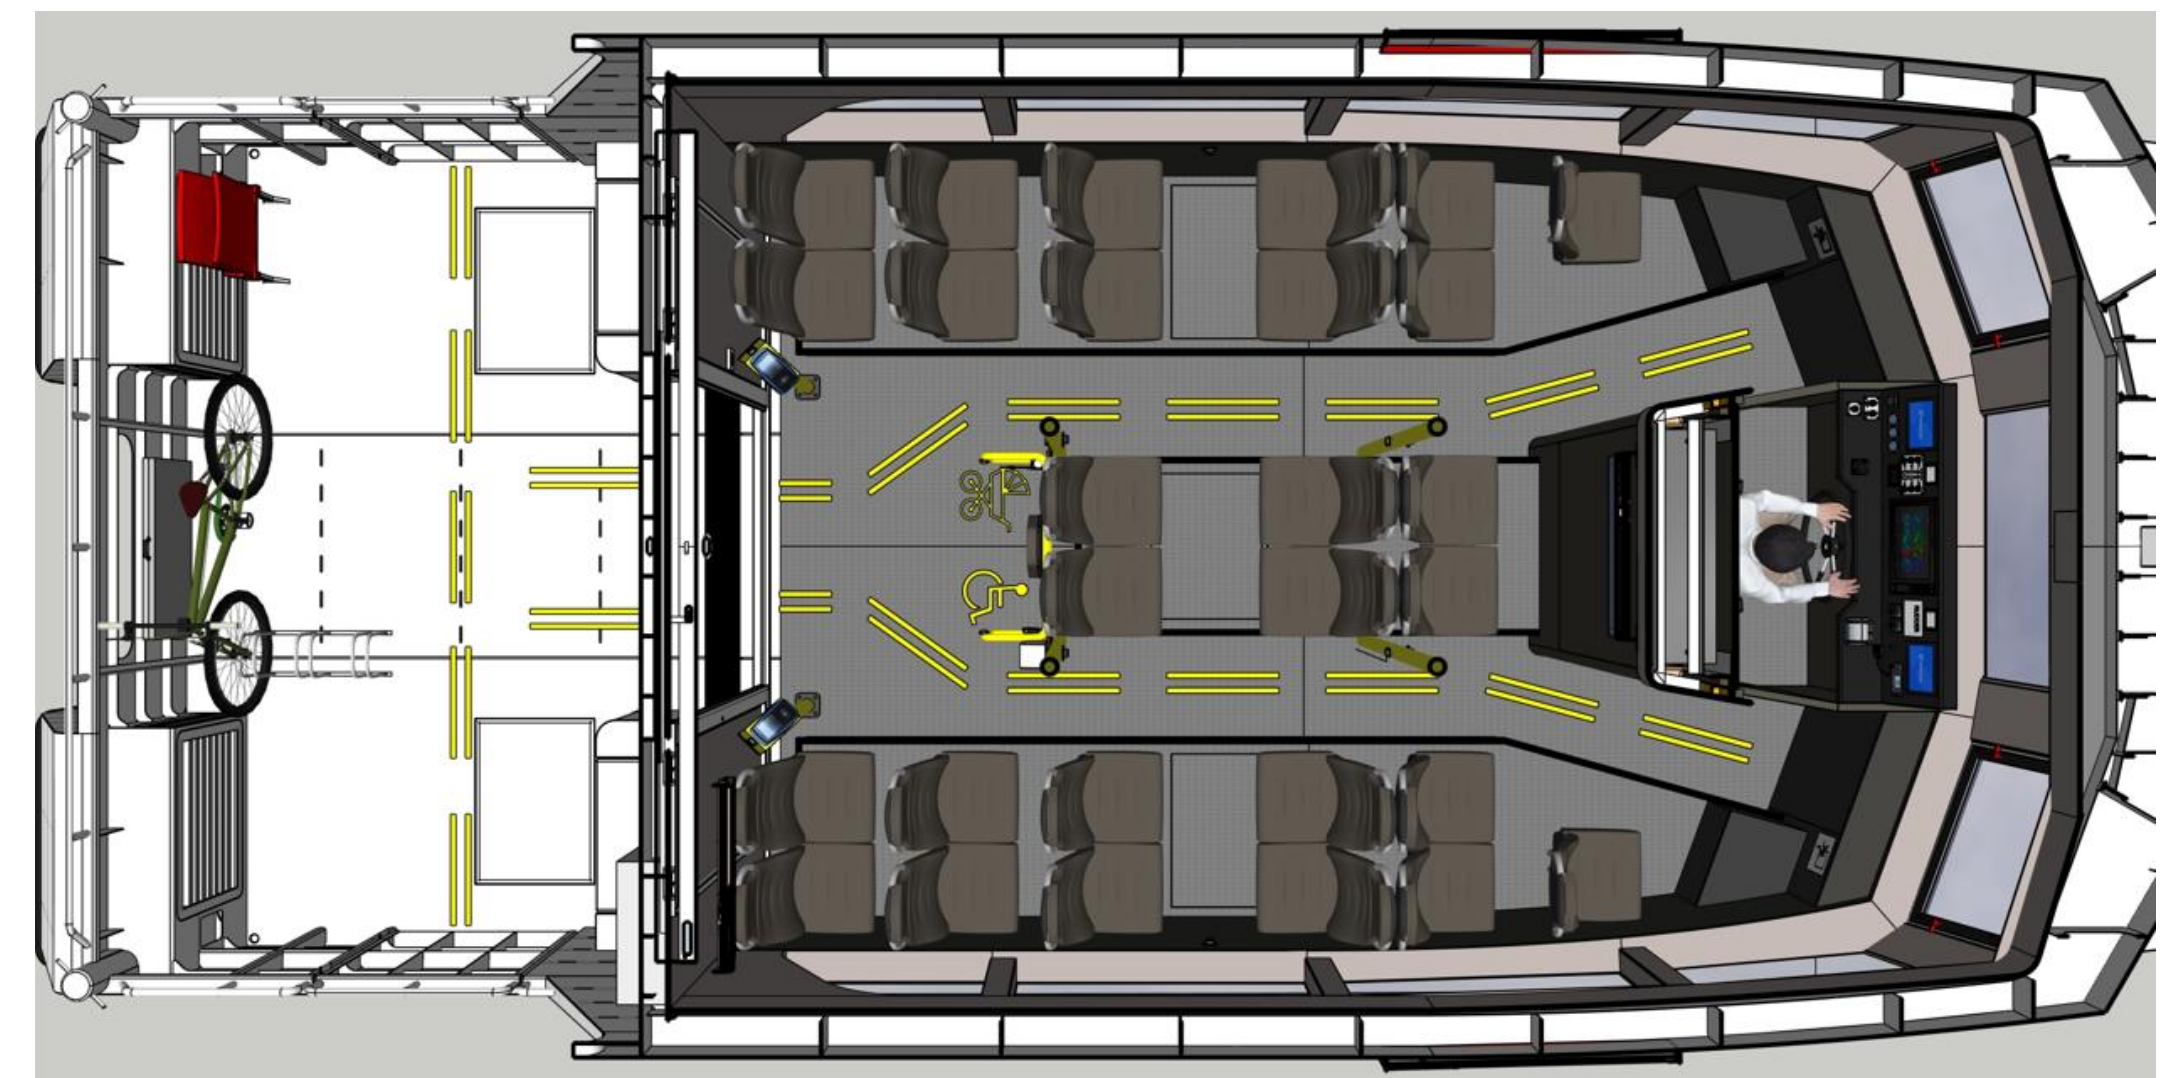

Laivų statyba

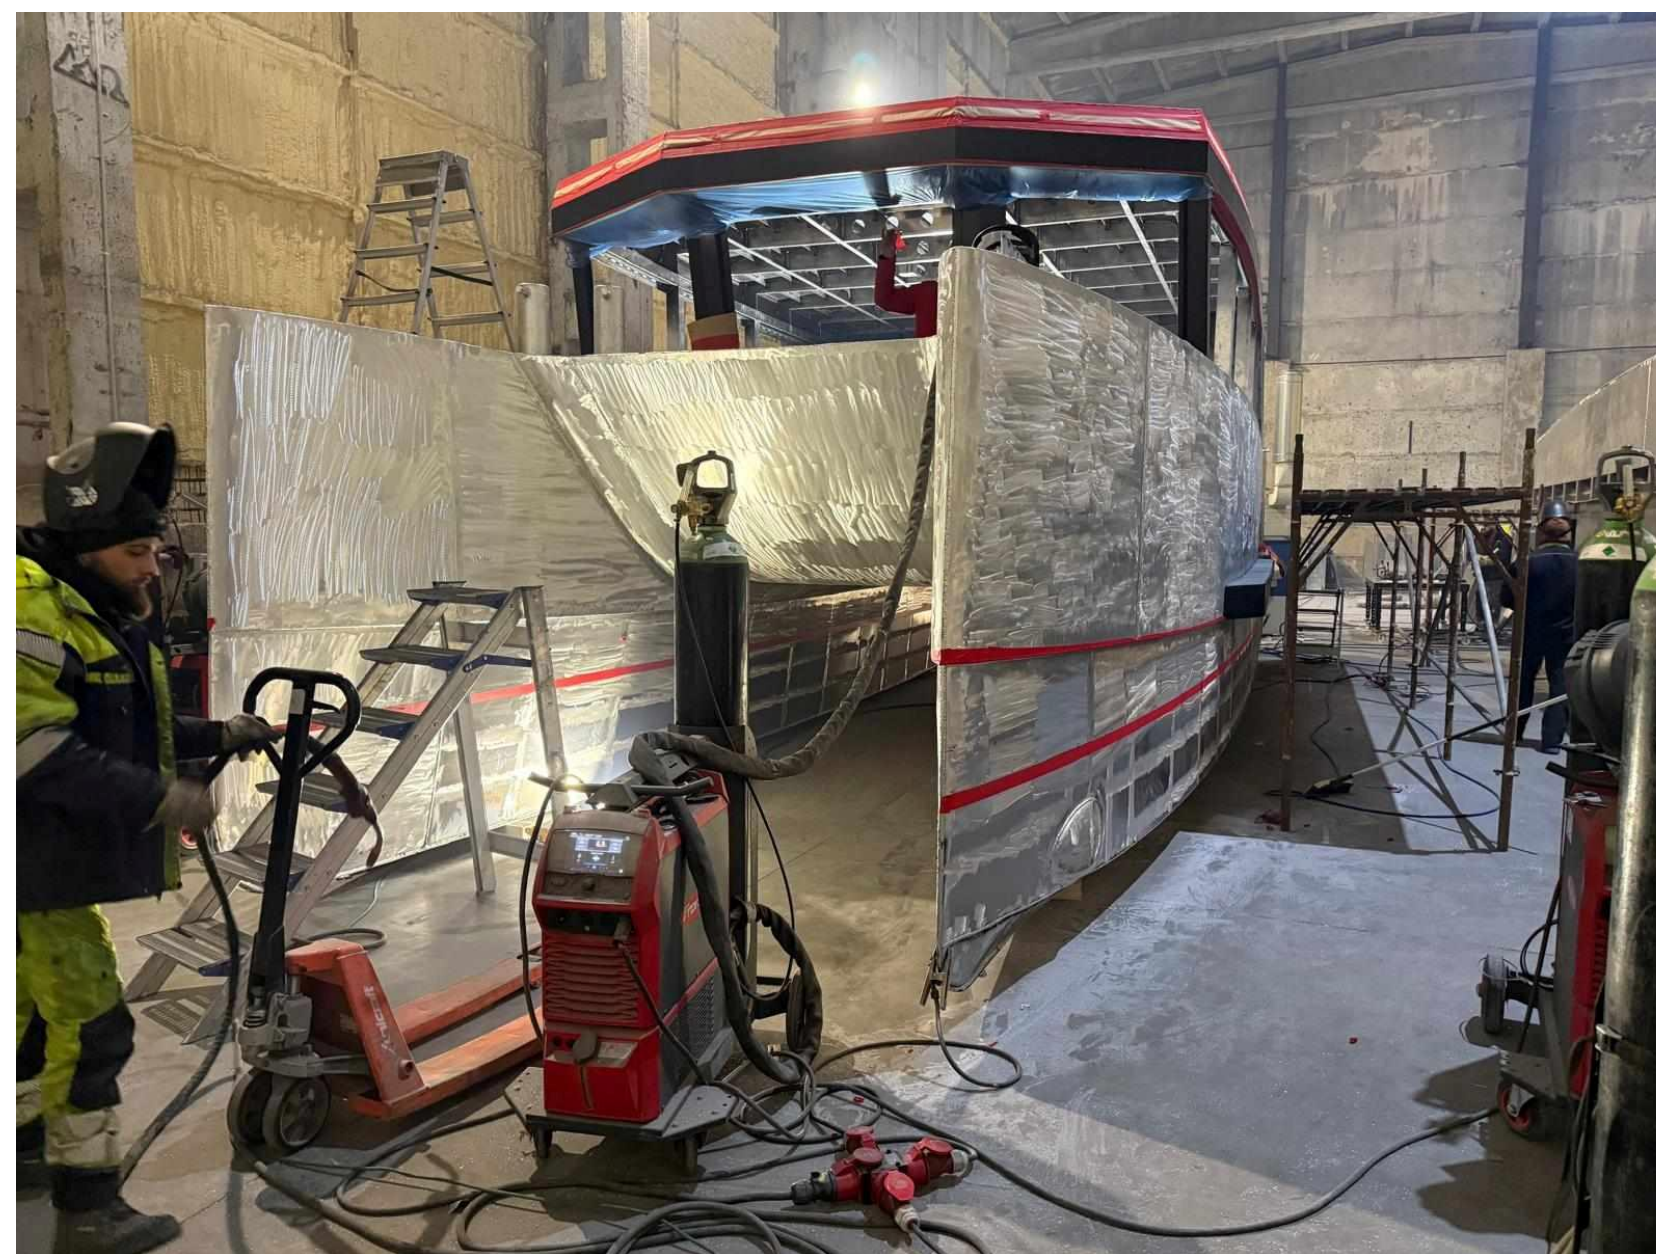

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas reguliuoja vidaus vandenų laivybos, uostų veiklos, keleivių, ir kt. santykius ir atsakomybes.


Reikalingi pakeitimai, neatitinkantys situacijos:

- **Keleivinio transporto įgulos reglamentavimas**
- ✓ **Komercinių ir nekomercinių prieplaukų reglamentavimas**
- **Keleivių kontrolės reglamentavimas**


ir kiti




Pagal pirminį VVKD parengtą seklumų šalinimo planą, numatyta valymo darbus atlikti:
Žvėryno, Šilo tilto ir Žirmūnų paplūdimio stotelėse

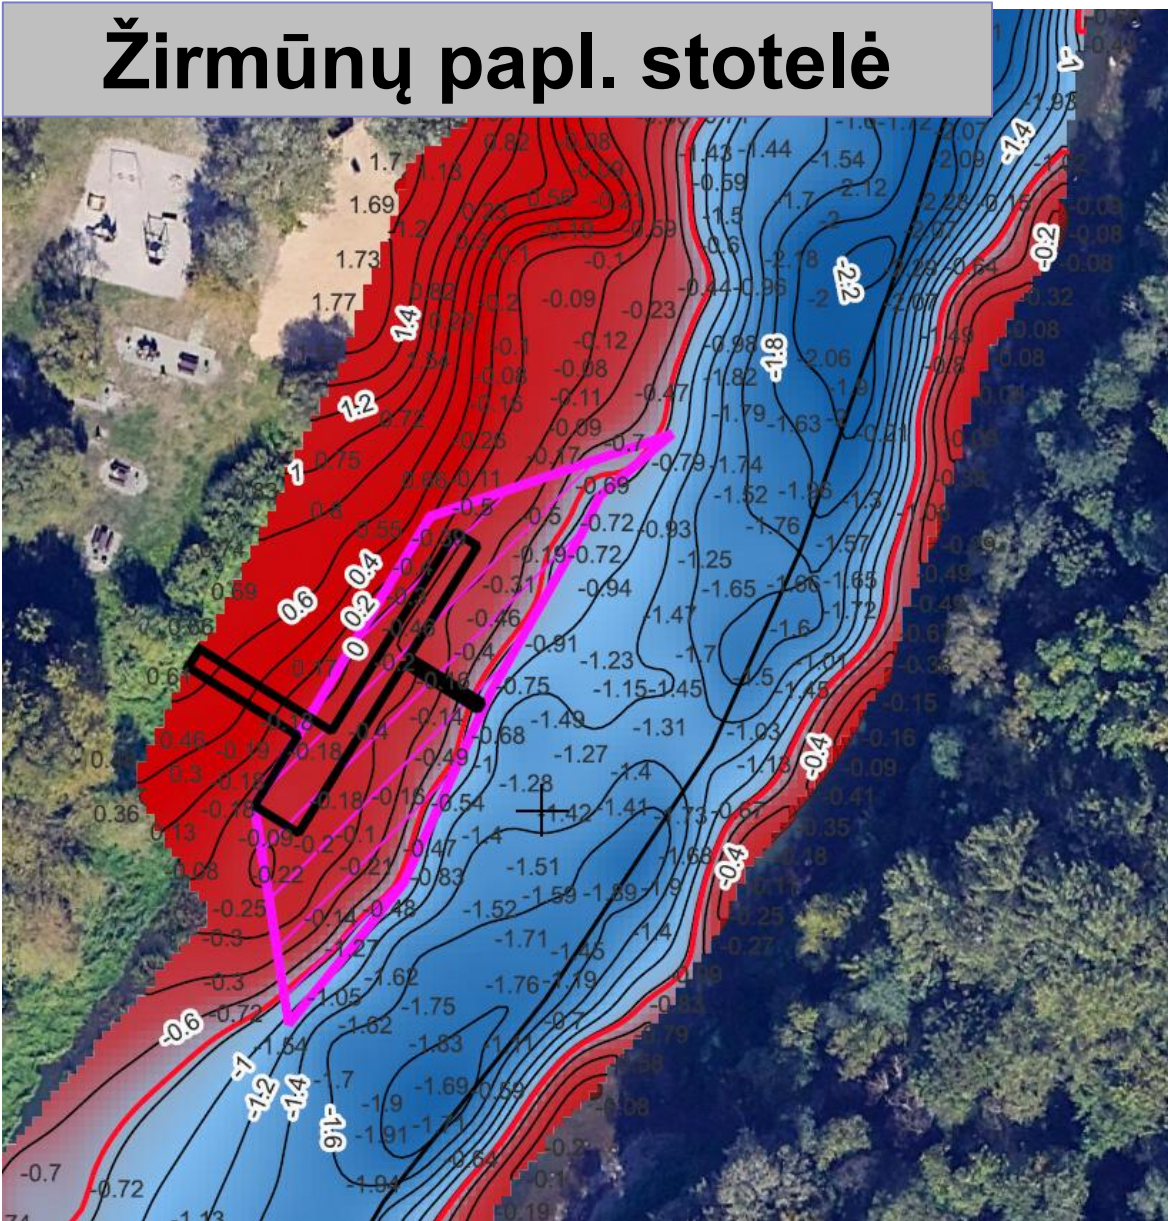


VALYMAS		
	UŽDUOTIS	ĮVYKDYMAS
Gylis m	1	
Plotis m	20	
Ilgis m	82	
Plotas m2	1022	
Darbo kiekis m3	630	
Gruntas	Sąnašinis gruntas	
Vidutinis nuimamo grunto sluoksnis: 0,61		

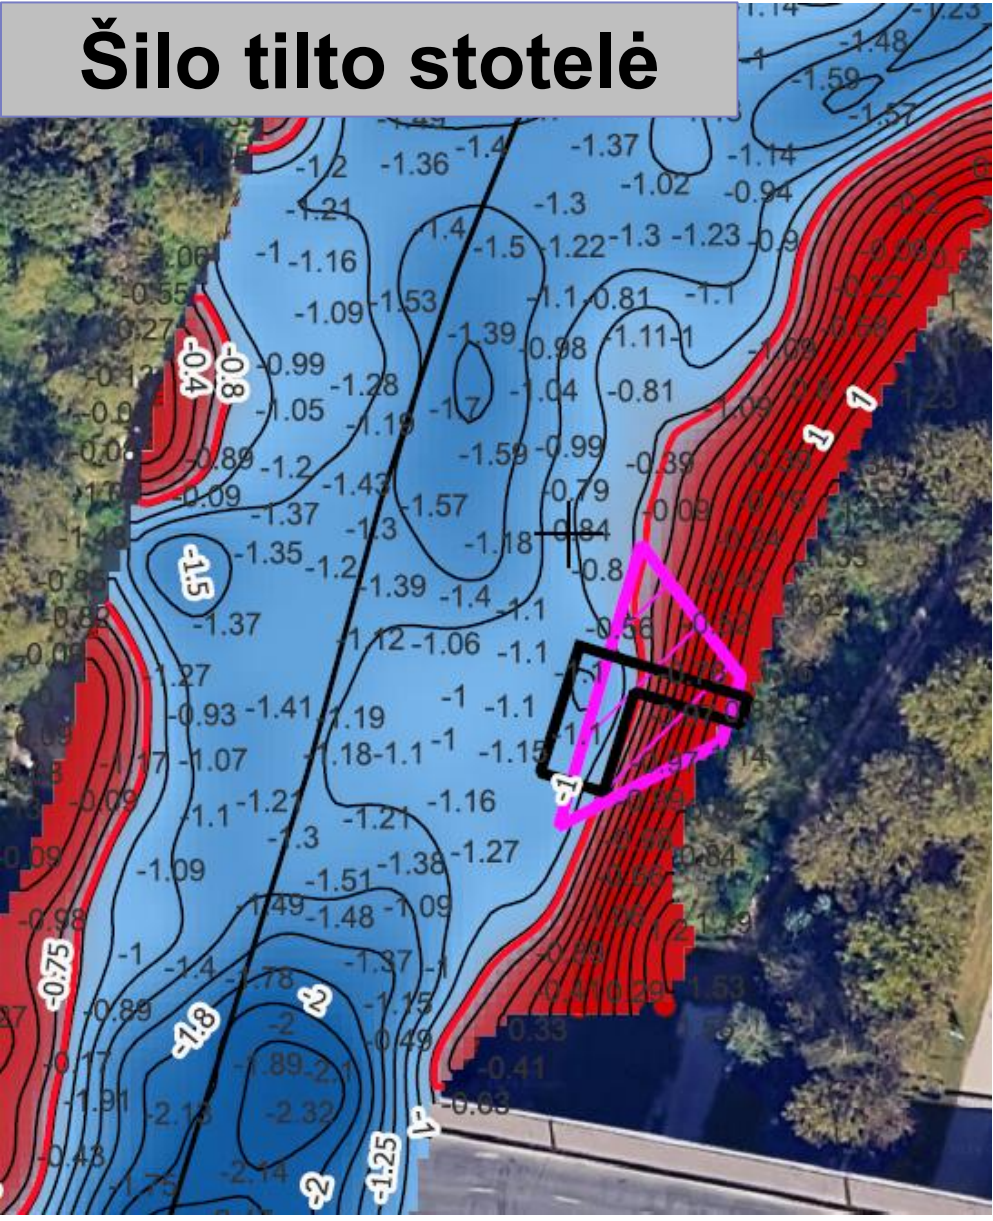


VALYMAS		
	UŽDUOTIS	ĮVYKDYMAS
Gylis m	1	
Plotis m	12	
Ilgis m	26	
Plotas m2	200	
Darbo kiekis m3	137	
Gruntas	Sąnašinis gruntas	
Vidutinis nuimamo grunto sluoksnis: 0,68		

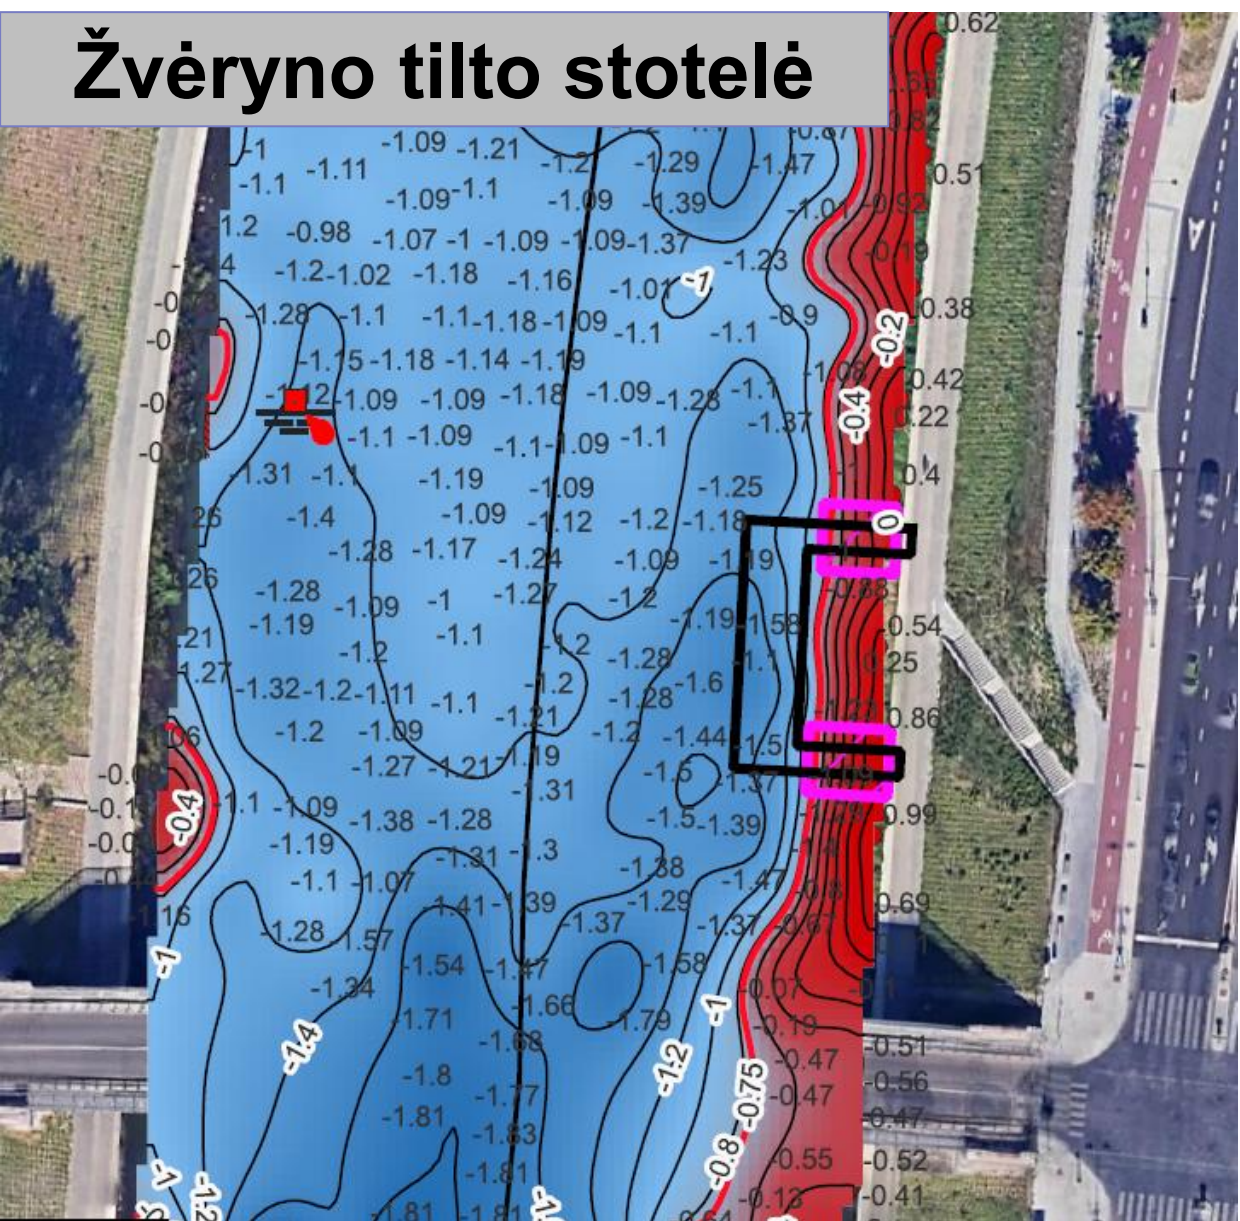


VALYMAS		
	UŽDUOTIS	ĮVYKDYMAS
Gylis m	1	
Plotis m	7	
Ilgis m	8	
Plotas m2	100	
Darbo kiekis m3	53	
Gruntas	Sąnašinis gruntas	
Vidutinis nuimamo grunto sluoksnis: 0,53		

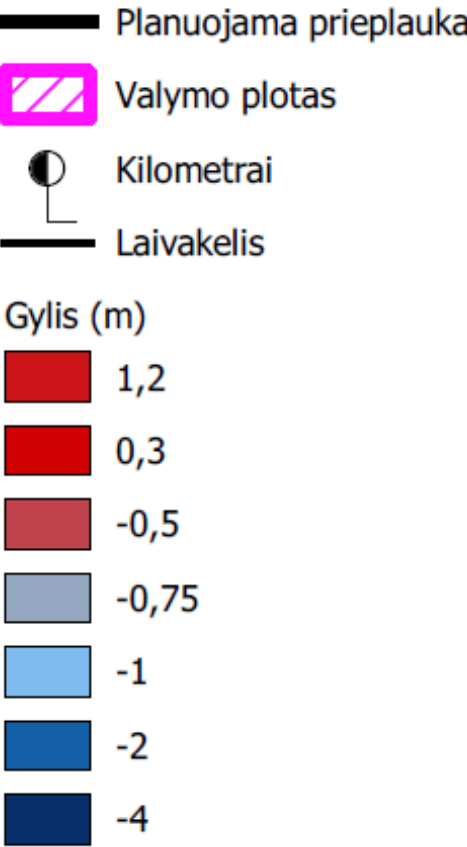

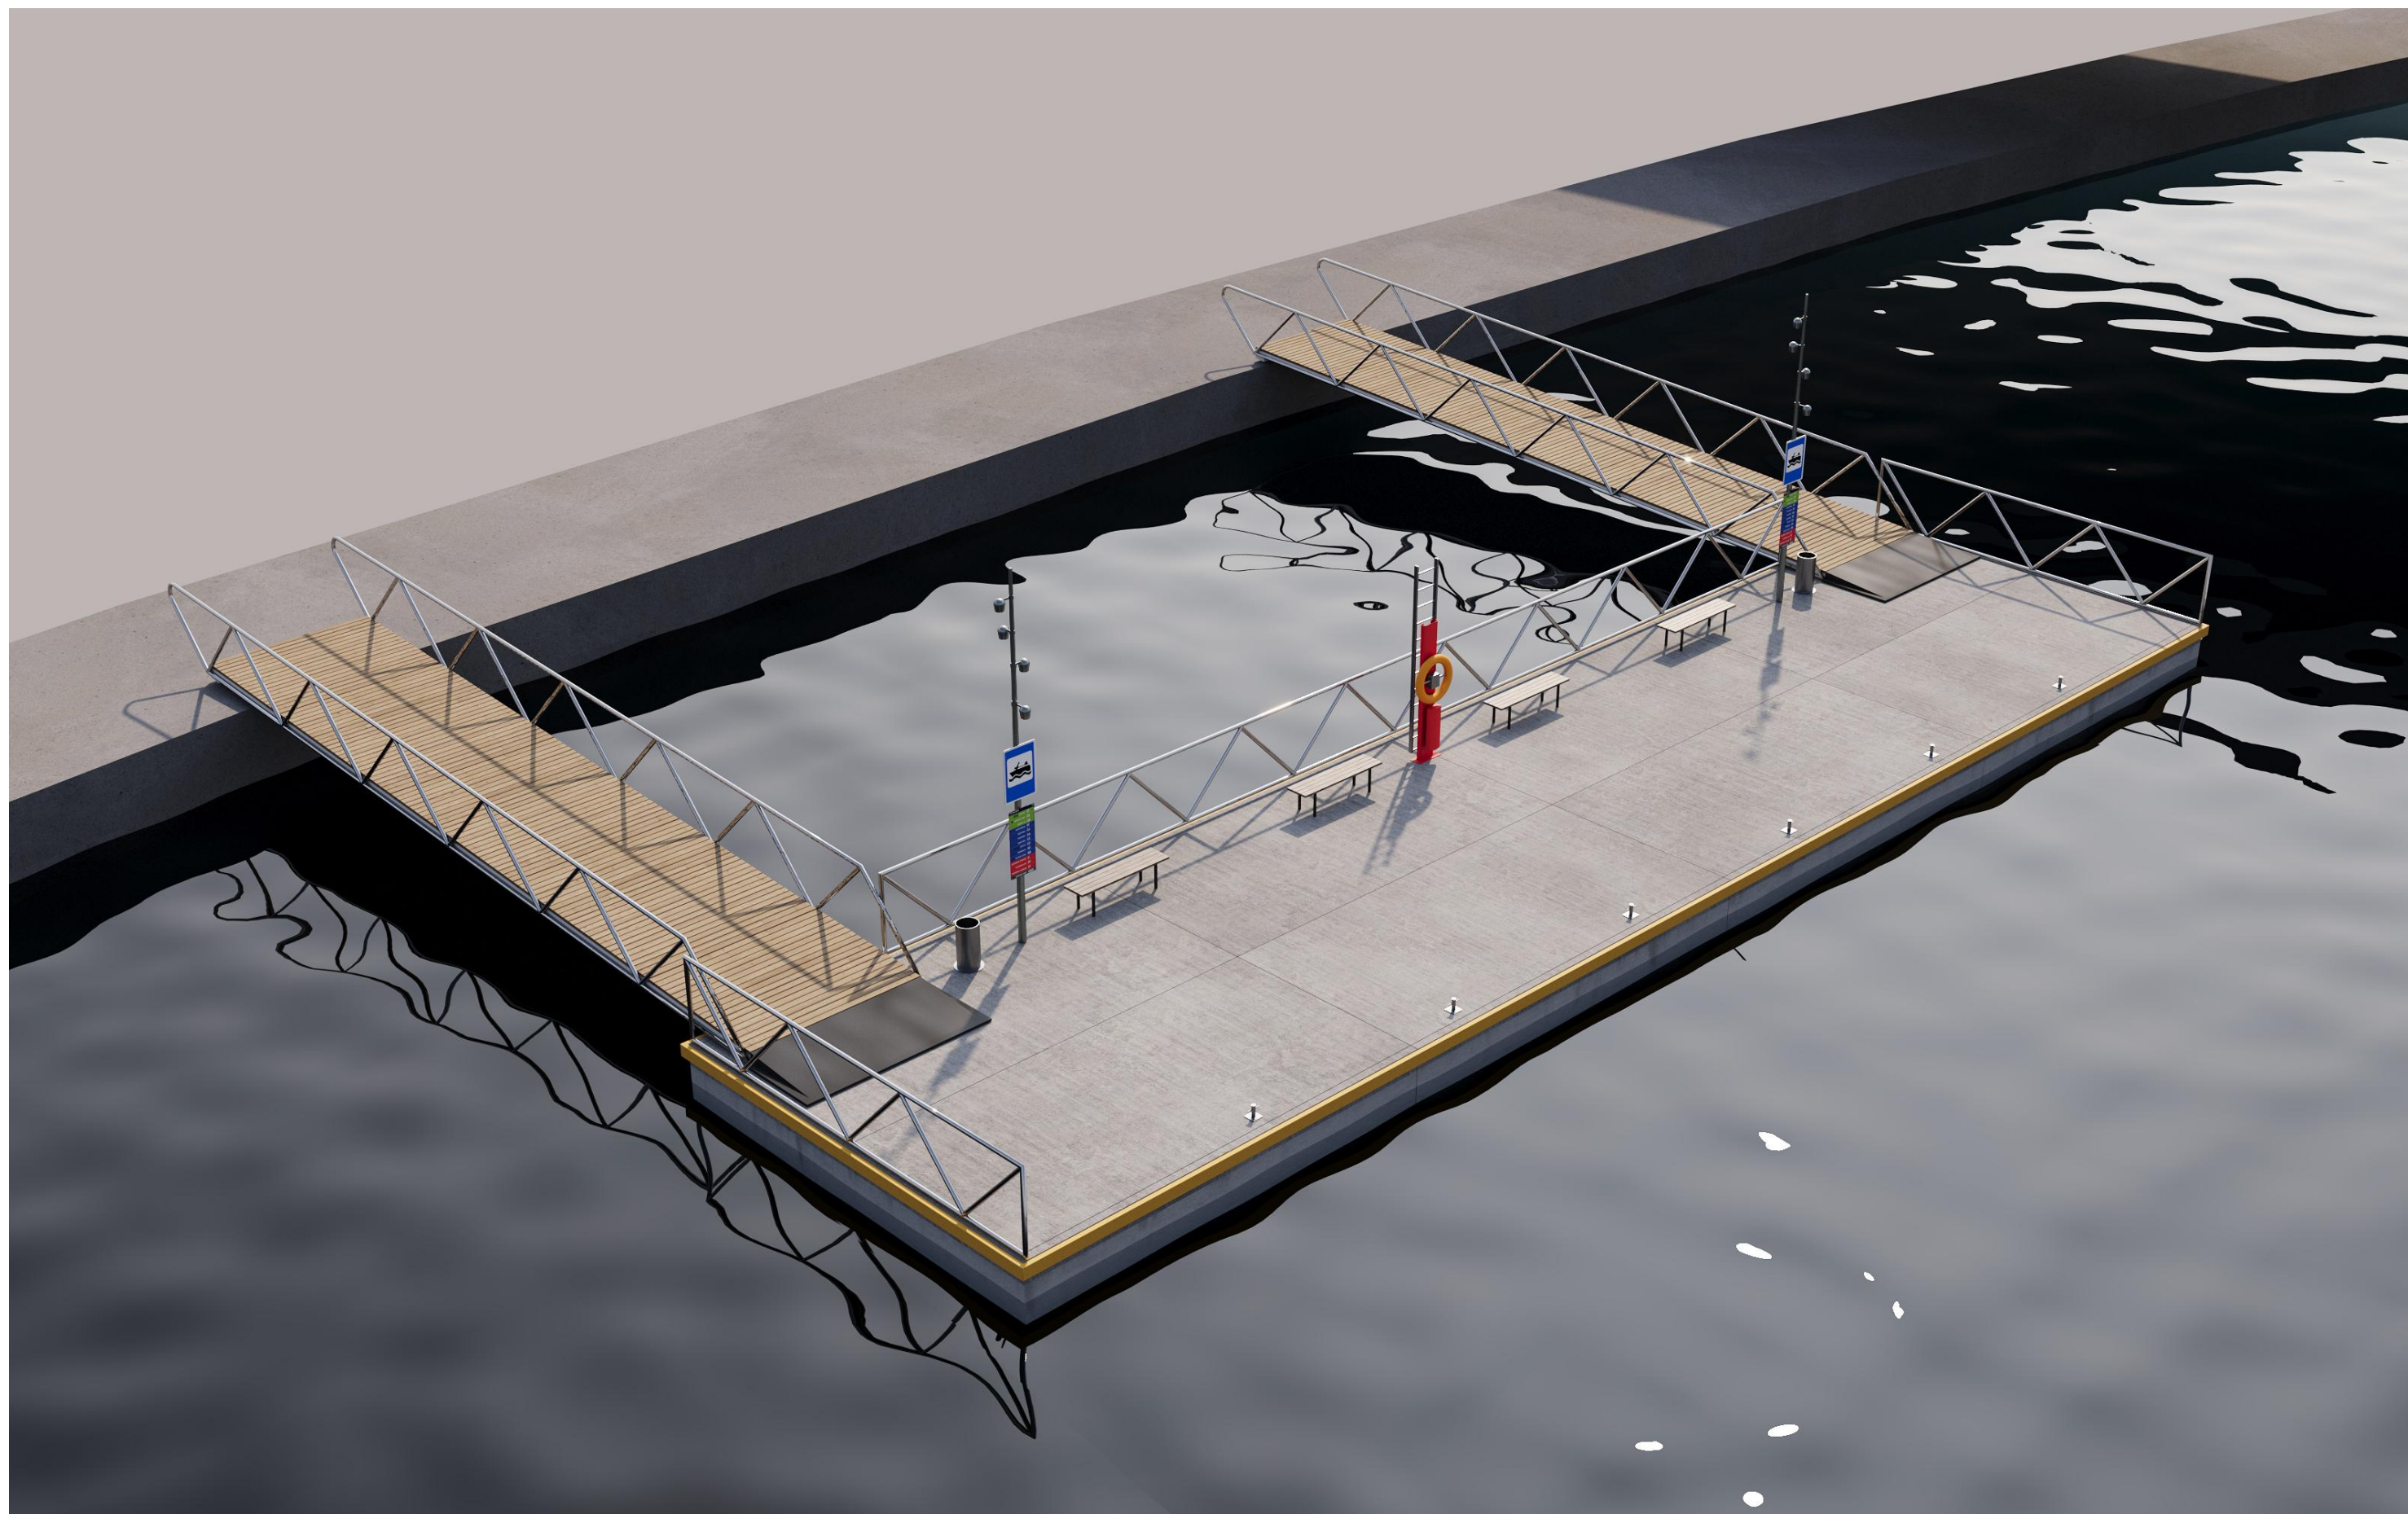


- Tilteliai pagal UD principus
- Apsauginiai turėklai
- Prieplaukos apšvietimas
- Stebėjimo kameros
- Taktiliniai paviršiai
- Informaciniai stendai

PRIEPLAUKŲ PROJEKTAI



Akvatorijos zona - 4149 m²;




Pantonai ir lieptelis;


ŽIRMŪNŲ PAPLŪDIMIO PRIEPLAUKA IR AKVATORIJA



ŽVĖRYNO TILTO PRIEPLAUKA IR AKVATORIJA

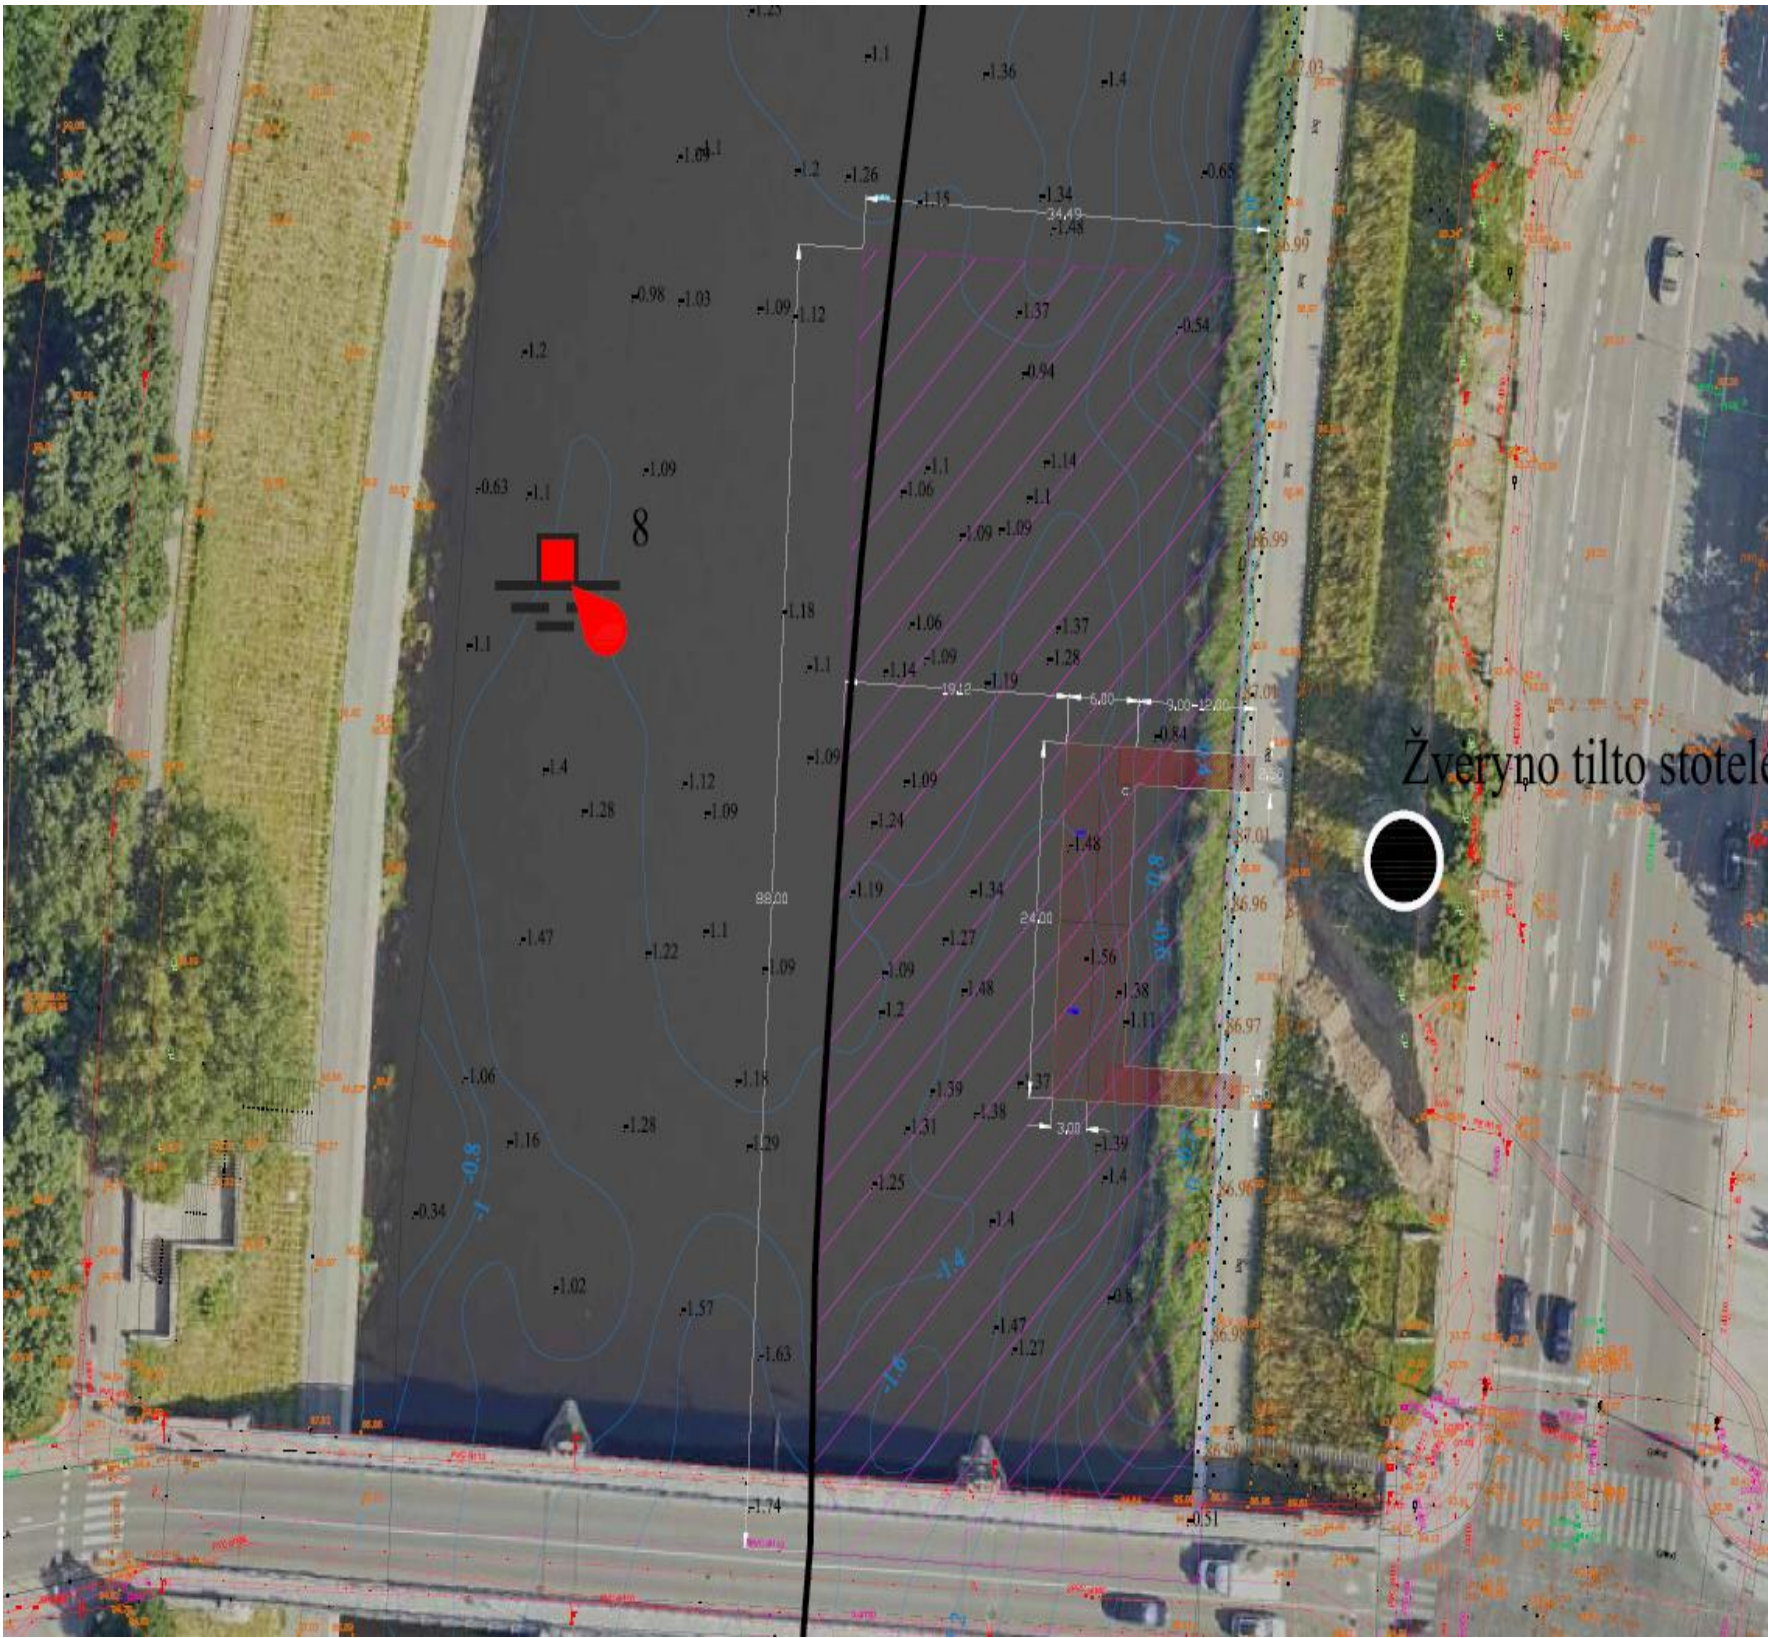

VERSLO TRIKAMPIO PRIEPLAUKA IR AKVATORIJA

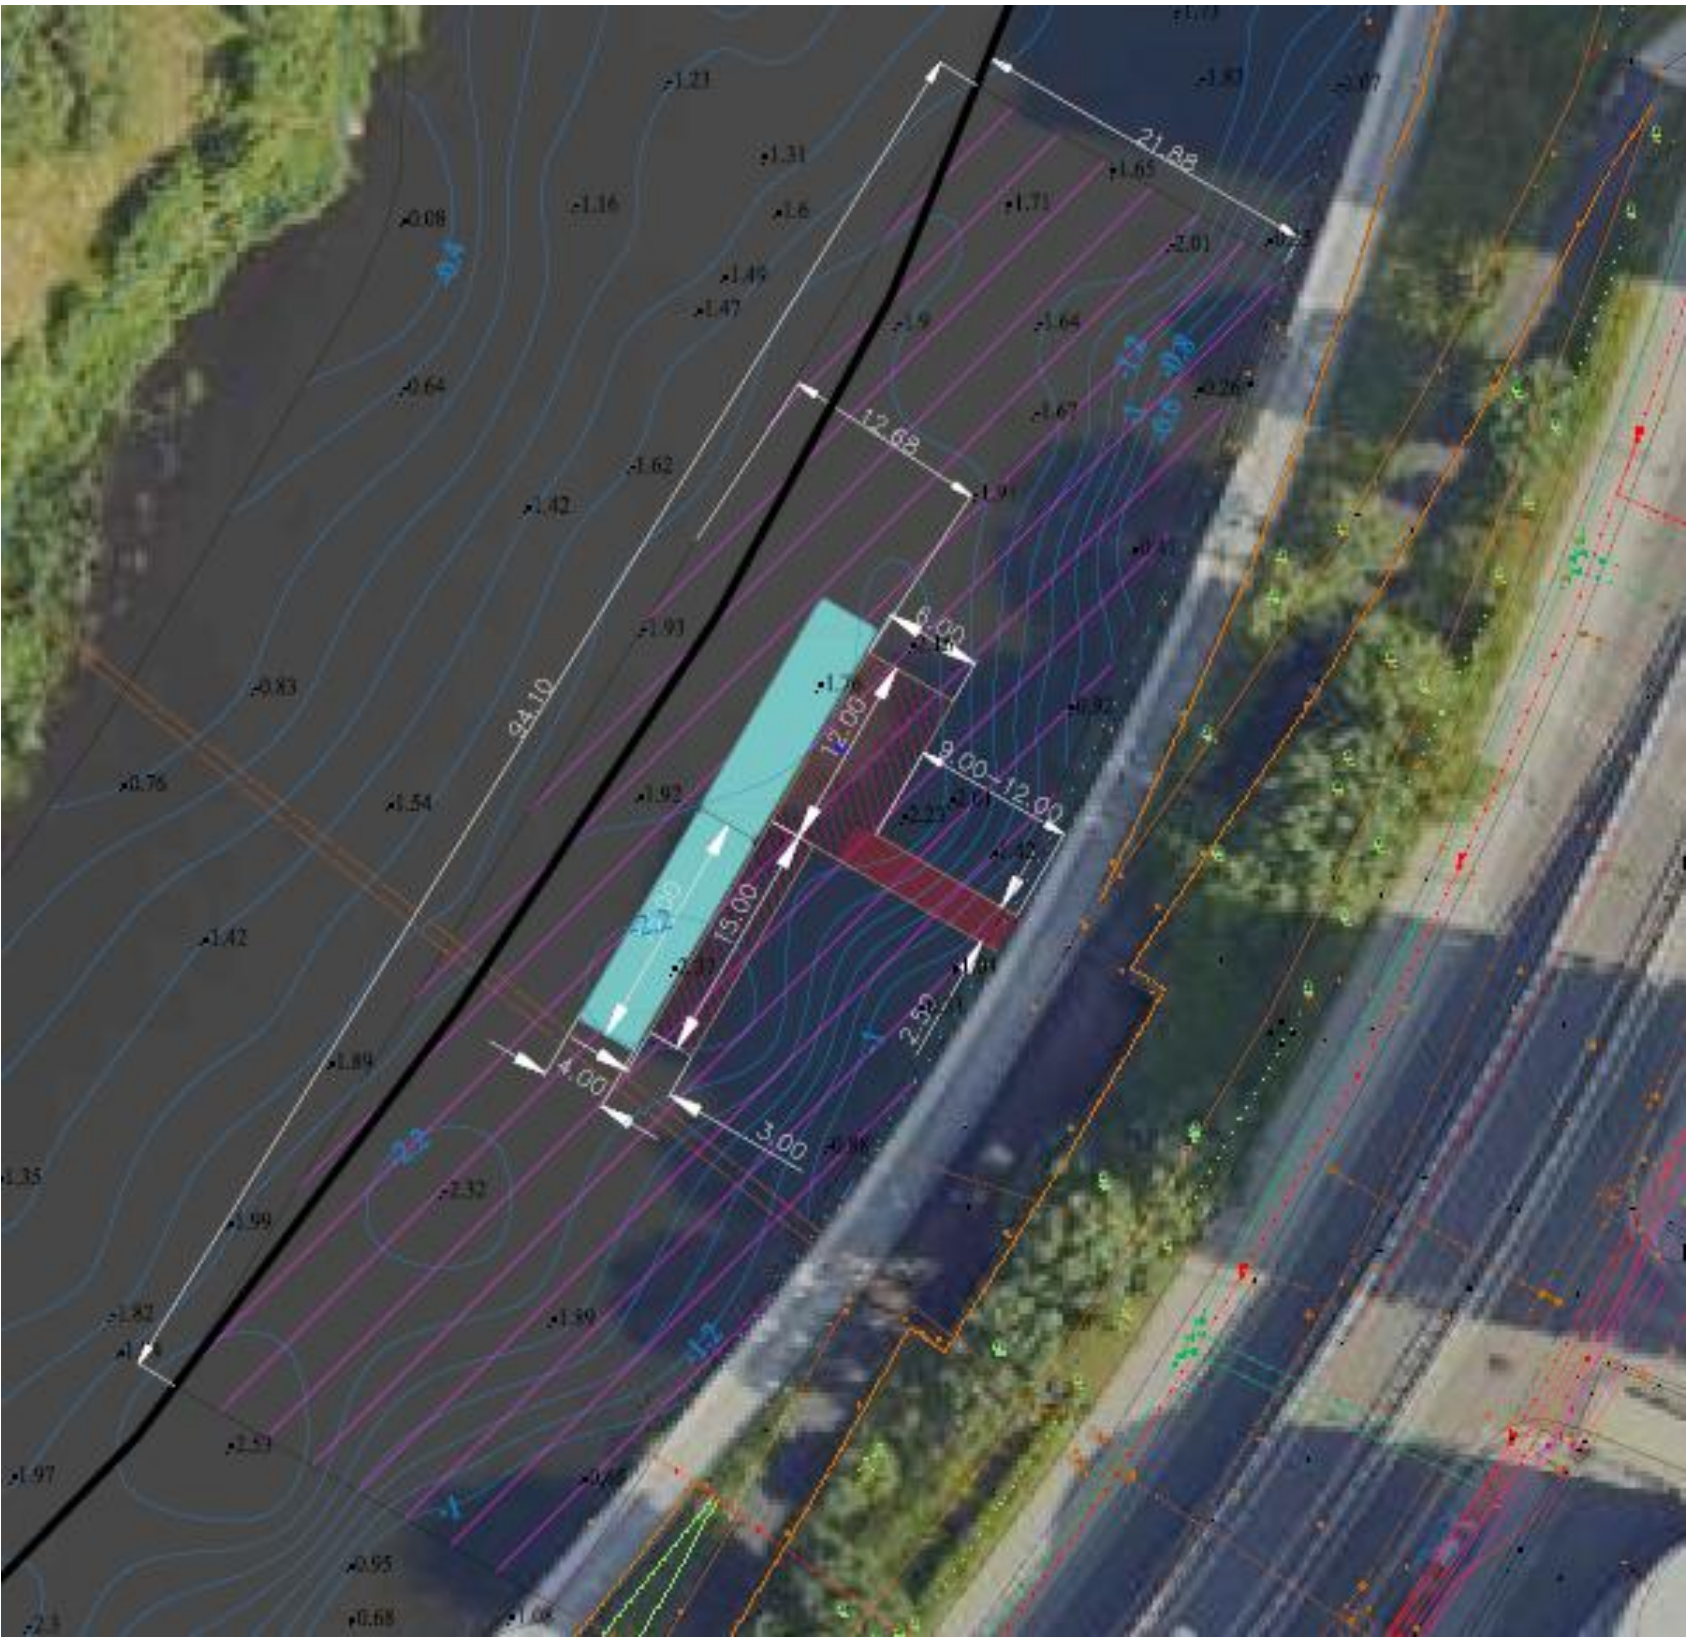

Karaliaus Mindaugo prieplauka ir laivas



	Mobilioje JUDU programėlėje/Savitarnoje	Laive
	3,0 Eur	
Vienkartinis bilietas – 90 min.	1,5 Eur (50% nuolaida)	4,0 Eur
	0,6 Eur (80% nuolaida)	
	5,0 Eur	
Pirmyn – atgal bilietas (2 bilietai x 90 min.)	2,5 Eur (50% nuolaida)	–
	1,0 Eur (80% nuolaida)	
Šeimos bilietas (2 suaugę ir iki 3 vaikų - iki 18 metų)	7,0 Eur	9,0 Eur

12:00

Pasirinkti Cenv bilietą

Vienkartinis



Šeimos bilietas



Norėdami aktyvuoti
prilieskite kortelę



Norėdami aktyvuoti
prilieskite kortelę



1.

**Vienkartinis bilietas
(90 min) – 4 Eur.**

2.

**Šeimos bilietas (90
min) – 9 Eur.**





Visuomenės pasiūlymai




Komisijos balsai



Galutinai renka visuomenė



<http://isrinkvarda.lt>

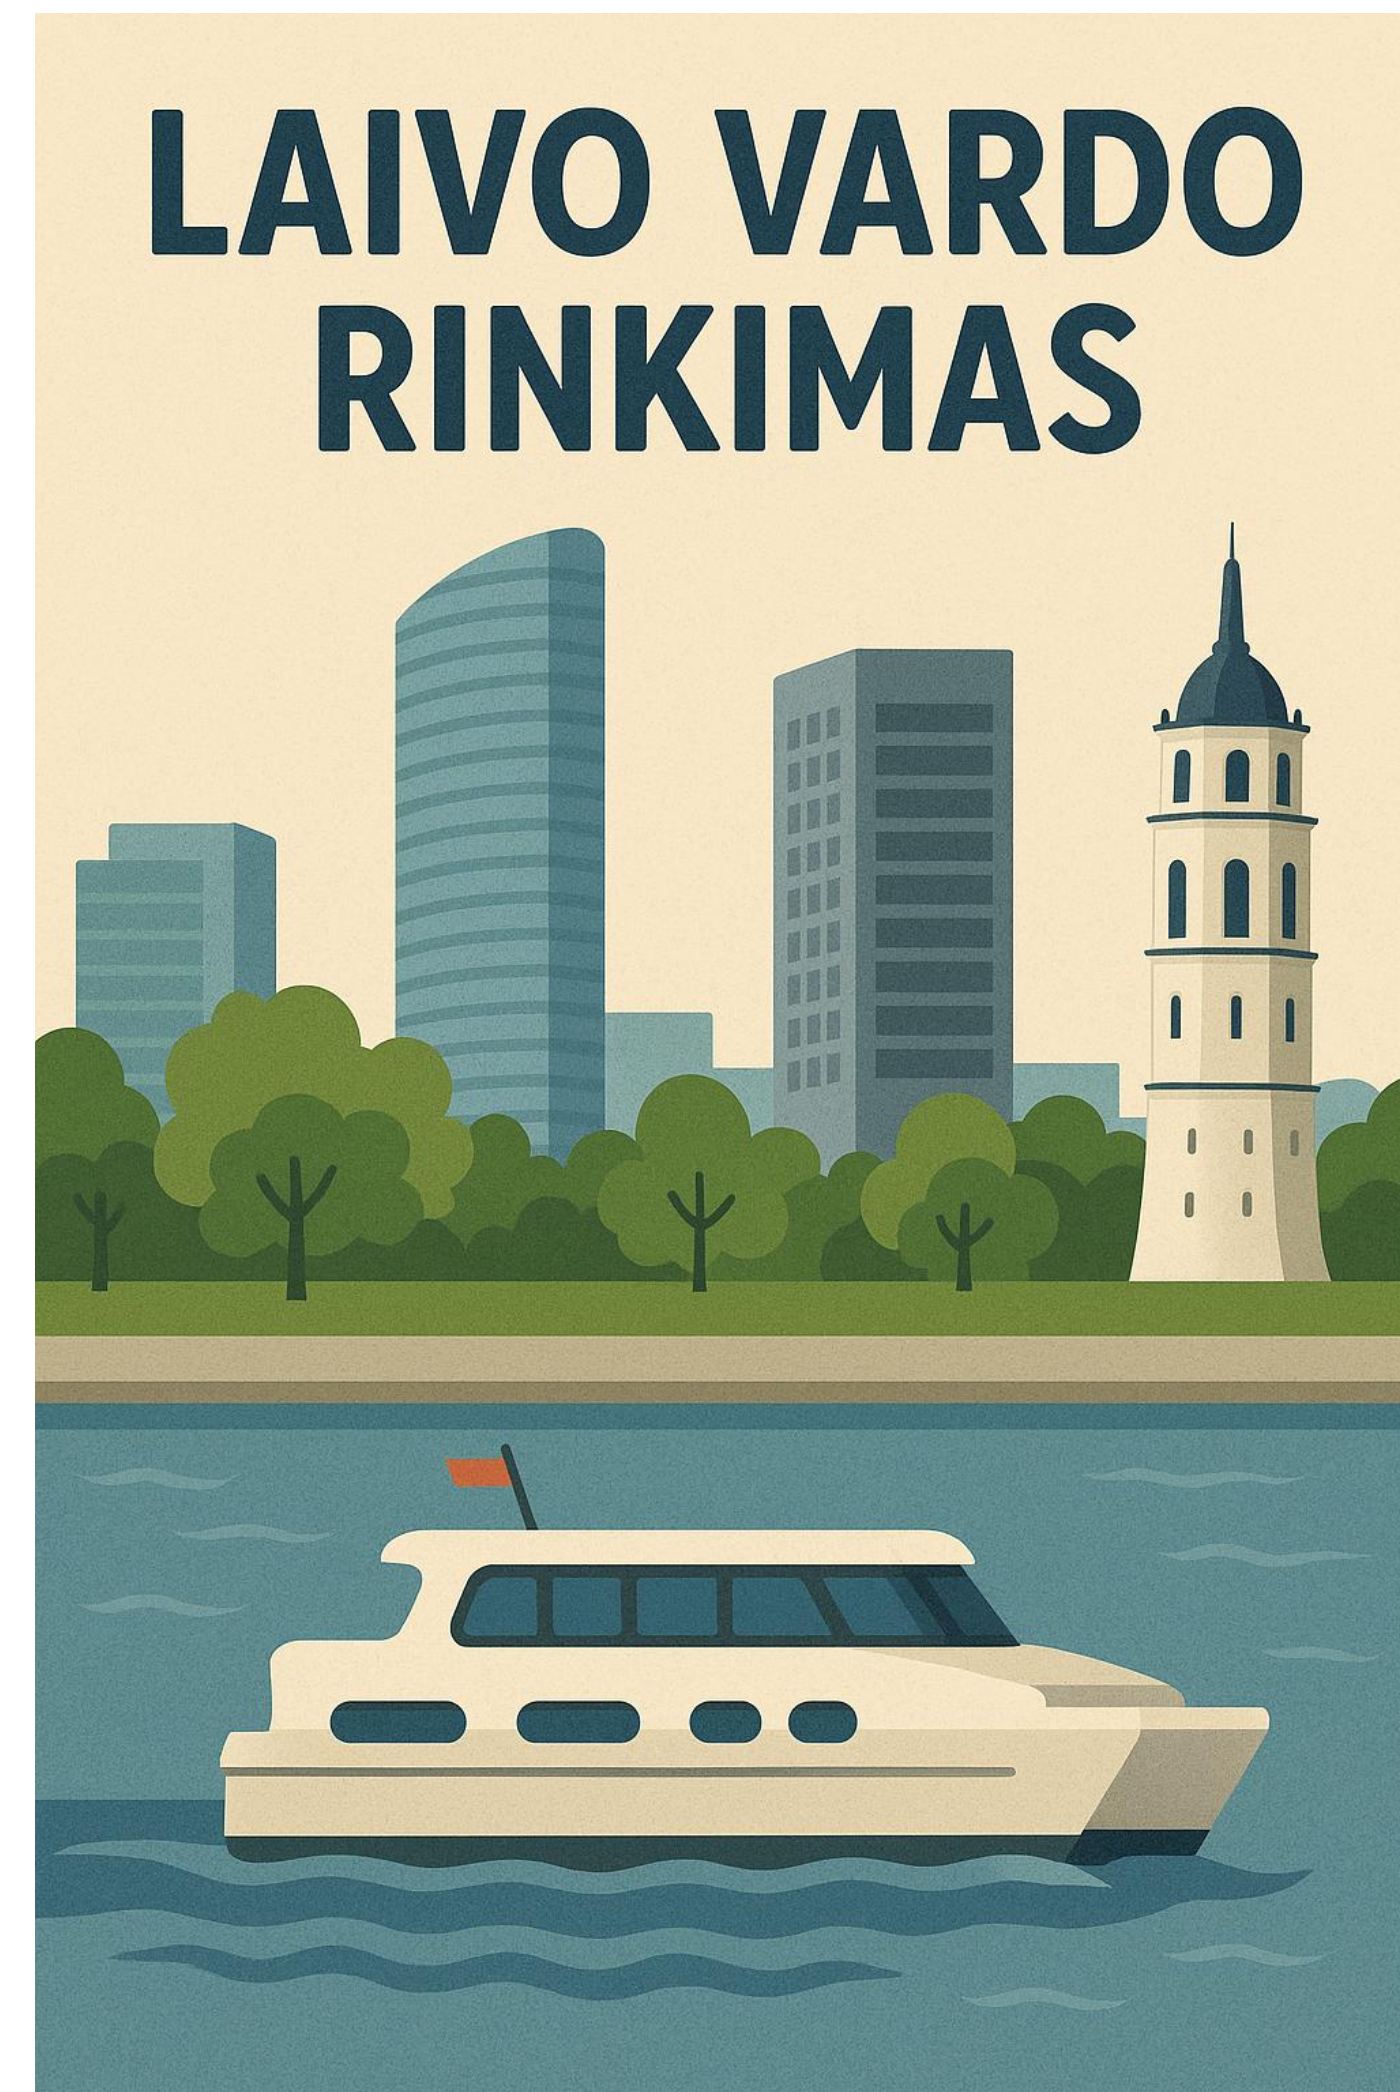

- 1. Laivų gamyba: laiku nepagamins, neužregistruos, neištestuos
- 2. Prieplaukos ir prieigos: nebus įrengtos
- 3. El.įkrovimas: nebus laiku įrengtas uostuose
- 4. Upės valymas: nebus išvalyta, išgilinta
- 5. Gamtinės sąlygos: sausra
- 6. Teisinis reglamentavimas: įteisinimas
- 7. Laivų įgula: nebus laiku apmokyta, nebus reikiamo kiekio



LAUKIAM LAIVYBOS SEZONO

AČIŲ UŽ DĖMESĮ

